

Comune di Macerata
 Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 28/09/2015

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX
 CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	m³	1,54	174,95	269,42
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	755,73	16,36	12'363,74
3 02.05.003* .001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e ... di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	cad	34,00	13,53	460,02
4 02.05.012* .001	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO...	m²	755,73	4,80	3'627,50
5 02.05.013* .001	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... I successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO...	m²	40,00	14,57	582,80
6 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO...	m²	14,77	34,00	502,18
7 03.03.025* .001	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. SOMMANO...	m³	4,92	2'777,49	13'665,24
8 04.01.009.00 2	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. SOMMANO...	m x cm	288,40	17,95	5'176,78
9 04.01.034.00 1	Formazione di nicchie. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mis ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie. SOMMANO...	cad	22,00	110,89	2'439,58
10 04.03.005 .001	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	65,00	26,58	1'727,70
11 04.03.008.00 1	Sarcitura di lesioni. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. SOMMANO...	m	51,00	29,12	1'485,12
12 04.04.007 .001	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO...	m²	50,37	32,59	1'641,56
13 07.01.005.00 4	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. SOMMANO...	m²	169,40	16,73	2'834,07
A R I P O R T A R E					
					46'775,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				46'775,71
14 07.02.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	121,44	9,78	1'187,68
15 07.02.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	364,32	2,71	987,31
16 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	137,70	1'785,97
17 11.02.006	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	127,87	1'658,47
18 15.05.001* .004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SOMMANO...	m	105,20	3,54	372,41
19 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m²	237,60	18,54	4'405,10
20 24.01.004* .002	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inol ... re il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura SOMMANO...	m²	121,44	9,81	1'191,33
21 24.01.007*	Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m³	1,59	283,76	451,18
22 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 SOMMANO...	m²	121,44	31,97	3'882,44
23 24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file. SOMMANO...	m²	237,60	33,29	7'909,70
24 24.10.001*	Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. SOMMANO...	kg	7'059,18	4,54	32'048,68
25 24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. SOMMANO...	kg	5'912,98	7,73	45'707,34
26 NP 01	Rimozione di fascia di pavimentazione della larghezza media di cm 45 ed una lunghezza massima di m 13,00, previo taglio con frullino o altro attrezzo manuale, demolizione e rimoz ... al piano, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	1'275,03	10'200,24
27 NP 02	Ripristino di pavimentazione in linoleum nelle fasce di pavimentazione precedentemente rimosse per l'inserimento delle catene, compresa la rasatura del massetto, la fornitura e pos ... rasporto e la movimentazione dei materiali e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	717,96	5'743,68
	A R I P O R T A R E				164'307,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				164'307,24
28 NP 05	Consolidamento di elementi in c.a. con nastri unidirezionali in fibra di carbonio da 300 gr/mq, applicati stucco epossidico e resina epossidica fluida da impregnazione- Prezzo a mq di nastro applicato SOMMANO...	mq	4,00	248,80	995,20
29 OPE 01	Operaio specializzato SOMMANO...	ore	48,00	0,00	0,00
30 OPE 02	Operaio qualificato SOMMANO...	ore	118,00	0,00	0,00
31 OPE 03	Manovale SOMMANO...	ore	46,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				165'302,44
	RIBASSO del 22,599% da considerare su euro				165'302,44
	T O T A L E euro				165'302,44
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<p style="text-align: center;"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 22,599% da applicare su euro 165'302,44 = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Macerata, 28/09/2015</p> <p style="text-align: center;"> SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (Sardellini Geom. Pierluigi) Il Direttore dei Lavori </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Dott. Ing. Luigino DEZI Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560 </div>				165'302,44 -37'356,70 <hr/> 127'945,74 <hr/> 127'945,74
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/09/2015

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 28/09/2015

(SICUREZZA GENERALE)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	m³	1,54	2,85	4,39
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	755,73	0,27	204,05
3 02.05.003* .001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e ... di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	cad	34,00	0,22	7,48
4 02.05.012* .001	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO...	m²	755,73	0,08	60,46
5 02.05.013* .001	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO...	m²	40,00	0,24	9,60
6 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO...	m²	14,77	0,74	10,93
7 03.03.025* .001	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. SOMMANO...	m³	4,92	60,58	298,04
8 04.01.009.00 2	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. SOMMANO...	m x cm	288,40	0,56	161,51
9 04.01.034.00 1	Formazione di nicchie. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mis ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie. SOMMANO...	cad	22,00	3,39	74,58
10 04.03.005 .001	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	65,00	0,81	52,65
11 04.03.008.00 1	Sarcitura di lesioni. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratt ... teriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. SOMMANO...	m	51,00	0,88	44,88
12 04.04.007 .001	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO...	m²	50,37	0,99	49,87
13 07.01.005.00 4	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. SOMMANO...	m²	169,40	0,36	60,98
A R I P O R T A R E					1'039,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'039,42
14 07.02.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	121,44	0,21	25,51
15 07.02.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	364,32	0,06	21,86
16 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	3,00	38,91
17 11.02.006	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	2,78	36,06
18 15.05.001* .004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SOMMANO...	m	105,20	0,06	6,31
19 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m²	237,60	0,63	149,68
20 24.01.004* .002	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inol ... re il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura SOMMANO...	m²	121,44	0,34	41,29
21 24.01.007*	Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m³	1,59	9,69	15,41
22 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 SOMMANO...	m²	121,44	1,09	132,37
23 24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file. SOMMANO...	m²	237,60	1,14	270,86
24 24.10.001*	Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. SOMMANO...	kg	7'059,18	0,16	1'129,47
25 24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. SOMMANO...	kg	5'912,98	0,27	1'596,50
26 NP 01	Rimozione di fascia di pavimentazione della larghezza media di cm 45 ed una lunghezza massima di m 13,00, previo taglio con frullino o altro attrezzo manuale, demolizione e rimoz ... al piano, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	26,02	208,16
27 NP 02	Ripristino di pavimentazione in linoleum nelle fasce di pavimentazione precedentemente rimosse per l'inserimento delle catene, compresa la rasatura del massetto, la fornitura e pos ... rasporto e la movimentazione dei materiali e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	14,65	117,20
	A R I P O R T A R E				4'829,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				4'829,01
28 NP 05	Consolidamento di elementi in c.a. con nastri unidirezionali in fibra di carbonio da 300 gr/mq, applicati stucco epossidico e resina epossidica fluida da impregnazione- Prezzo a mq di nastro applicato SOMMANO...	mq	4,00	7,70	30,80
29 OPE 01	Operaio specializzato SOMMANO...	ore	48,00	32,27	1'548,96
30 OPE 02	Operaio qualificato SOMMANO...	ore	118,00	30,01	3'541,18
31 OPE 03	Manovale SOMMANO...	ore	46,00	27,06	1'244,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro				11'194,71
	TOTALE euro				11'194,71
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	RIEPILOGO FINALE				
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> LAVORI A MISURA euro				11'194,71
	TOTALE euro				11'194,71
	Macerata, 28/09/2015 L'Impresa SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (<i>Sardellini Geom. Pierluigi</i>) Il Direttore dei Lavori				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dott. Ing. Luigino DEZI Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560 </div>				
	A RIPORTARE				

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 28/09/2015

(SICUREZZA SPECIALE)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX
CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 02.05.014*	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per il fissaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente	SOMMANO...	m²	78,70	13,67	1'075,83
2 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)	SOMMANO...	m	42,00	10,20	428,40
3 26.01.01.25. 001	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese	SOMMANO...	m²	98,46	5,36	527,75
4 OPE 01	Operaio specializzato	SOMMANO...	ore	9,00	32,27	290,43
5 OPE 02	Operaio qualificato	SOMMANO...	ore	24,00	30,01	720,24
6 PSIC_01	Realizzazione di tunnel protetto copro B	SOMMANO...	C.po	1,00	3'400,00	3'400,00
7 PSIC_02	Installazione di illuminazione di segnalazione	SOMMANO...	C.po	1,00	223,80	223,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro					6'666,45
	T O T A L E euro					6'666,45
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso LAVORI A MISURA euro				6'666,45
	TOTALE euro				6'666,45
	Macerata, 28/09/2015 L'Impresa Il Direttore dei Lavori				
	SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (Sardellini Geom. Pierluigi)				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dott. Ing. Luigino DEZI Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560 </div>				
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/09/2015

Acc. 2

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 36'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2015	90'400,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		90'400,00
anticipazione		0,00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata		
Il Direttore dei Lavori		
Dott. Ing. Luigino DEZI		
Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	127'945,74
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	127'945,74
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	639,73
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	90'400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	91'039,73
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	36'900,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	36'900,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 36'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro trentaseimilanovecento/00).

Macerata, 28/09/2015



Acc. 2 bis

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 6'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2015	4'200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		4'200,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	11'194,71
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	11'194,71
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	55,97
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	4'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	4'255,97
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	6'900,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	6'900,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 6'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro seimilanovecento/00).


Macerata, 28/09/2015

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luigino D.E.Z. I
Ordine Ingegneri Prov./Ancona n. 560



Comune di Macerata
Provincia di Macerata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 2'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2015	4'500,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		4'500,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	6'666,45
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	6'666,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	33,33
Ammontare dei certificati precedenti euro	4'500,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	4'533,33
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	2'100,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	2'100,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 2'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duemilacento/00).

Macerata, 28/09/2015

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luigino DEZI

Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	m³	1,54	174,95	269,42
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	755,73	16,36	12'363,74
3 02.05.003* .001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e ... di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	cad	34,00	13,53	460,02
4 02.05.012* .001	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO...	m²	755,73	4,80	3'627,50
5 02.05.013* .001	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... I successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO...	m²	40,00	14,57	582,80
6 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO...	m²	14,77	34,00	502,18
7 03.03.025* .001	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. SOMMANO...	m³	4,92	2'777,49	13'665,24
8 04.01.009.00 2	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. SOMMANO...	m x cm	288,40	17,95	5'176,78
9 04.01.034.00 1	Formazione di nicchie. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mis ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie. SOMMANO...	cad	22,00	110,89	2'439,58
10 04.03.005 .001	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	65,00	26,58	1'727,70
11 04.03.008.00 1	Sarcitura di lesioni. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. SOMMANO...	m	51,00	29,12	1'485,12
12 04.04.007 .001	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO...	m²	50,37	32,59	1'641,56
13 07.01.005.00 4	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. SOMMANO...	m²	169,40	16,73	2'834,07
	A R I P O R T A R E				46'775,71


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				46'775,71
14 07.02.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	121,44	9,78	1'187,68
15 07.02.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	364,32	2,71	987,31
16 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	137,70	1'785,97
17 11.02.006	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	127,87	1'658,47
18 15.05.001* .004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SOMMANO...	m	105,20	3,54	372,41
19 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m²	237,60	18,54	4'405,10
20 24.01.004* .002	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inol ... re il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura SOMMANO...	m²	121,44	9,81	1'191,33
21 24.01.007*	Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rim ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m³	1,59	283,76	451,18
22 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 SOMMANO...	m²	121,44	31,97	3'882,44
23 24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colpi e dei coppi in tutte le file. SOMMANO...	m²	237,60	33,29	7'909,70
24 24.10.001*	Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. SOMMANO...	kg	7'059,18	4,54	32'048,68
25 24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. SOMMANO...	kg	5'912,98	7,73	45'707,34
26 NP 01	Rimozione di fascia di pavimentazione della larghezza media di cm 45 ed una lunghezza massima di m 13,00, previo taglio con frullino o altro attrezzo manuale, demolizione e rimoz ... al piano, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	1'275,03	10'200,24
27 NP 02	Ripristino di pavimentazione in linoleum nelle fasce di pavimentazione precedentemente rimosse per l'inserimento delle catene, compresa la rasatura del massetto, la fornitura e pos ... rasporto e la movimentazione dei materiali e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	717,96	5'743,68
	A R I P O R T A R E				164'307,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				164'307,24
28 NP 05	Consolidamento di elementi in c.a. con nastri unidirezionali in fibra di carbonio da 300 gr/mq. applicati stucco epossidico e resina epossidica fluida da impregnazione- Prezzo a mq di nastro applicato				
	SOMMANO...	mq	4,00	248,80	995,20
29 OPE 01	Operaio specializzato				
	SOMMANO...	ore	48,00	0,00	0,00
30 OPE 02	Operaio qualificato				
	SOMMANO...	ore	118,00	0,00	0,00
31 OPE 03	Manovale				
	SOMMANO...	ore	46,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				165'302,44
	RIBASSO del 22,599% da considerare su euro				165'302,44
	TOTALE euro				165'302,44
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>				
	<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>				
	LAVORI A MISURA euro				165'302,44
	RIBASSO del 22,599% da applicare su euro 165'302,44 = euro				-37'356,70
	PER LAVORI A MISURA euro				127'945,74
	TOTALE euro				127'945,74
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>					
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro					127'945,74
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:					
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>					
	Certificato N.1 del 21/02/2015 euro				90'400,00	
	Certificato N.2 del 28/09/2015 euro				36'900,00	
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro					127'300,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro					127'300,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro					645,74
	Macerata, 28/09/2015					
	<p>L'Impresa SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (Sardellini Geom. Pierluigi)</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dott. Ing. Luigino D E Z I Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560 </div>					
	<p>VISTO IL RUP.</p> 					
	A RIPIARTARE					

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
 STATO FINALE DEI LAVORI

Comune di Macerata
 Provincia di Macerata

STATO FINALE DEI LAVORI
 (SICUREZZA GENERALE)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data ___/___/___ rep. n. registrato a in data ___/___/___ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	___/___/___	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___		
Data FINE LAVORI:	___/___/___	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	m³	1,54	2,85	4,39
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	755,73	0,27	204,05
3 02.05.003* .001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e ... di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	cad	34,00	0,22	7,48
4 02.05.012* .001	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO...	m²	755,73	0,08	60,46
5 02.05.013* .001	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO...	m²	40,00	0,24	9,60
6 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO...	m²	14,77	0,74	10,93
7 03.03.025* .001	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. SOMMANO...	m³	4,92	60,58	298,04
8 04.01.009.00 2	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. SOMMANO...	m x cm	288,40	0,56	161,51
9 04.01.034.00 1	Formazione di nicchie. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mis ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie. SOMMANO...	cad	22,00	3,39	74,58
10 04.03.005 .001	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	65,00	0,81	52,65
11 04.03.008.00 1	Sarcitura di lesioni. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratt ... teriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. SOMMANO...	m	51,00	0,88	44,88
12 04.04.007 .001	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. SOMMANO...	m²	50,37	0,99	49,87
13 07.01.005.00 4	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. SOMMANO...	m²	169,40	0,36	60,98
A R I P O R T A R E					
					1'039,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'039,42
14 07.02.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	121,44	0,21	25,51
15 07.02.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. SOMMANO...	m²	364,32	0,06	21,86
16 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	3,00	38,91
17 11.02.006	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. SOMMANO...	1000kg	12,97	2,78	36,06
18 15.05.001* .004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SOMMANO...	m	105,20	0,06	6,31
19 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m²	237,60	0,63	149,68
20 24.01.004* .002	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inol ... re il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura SOMMANO...	m²	121,44	0,34	41,29
21 24.01.007*	Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. SOMMANO...	m³	1,59	9,69	15,41
22 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 SOMMANO...	m²	121,44	1,09	132,37
23 24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file. SOMMANO...	m²	237,60	1,14	270,86
24 24.10.001*	Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d ... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. SOMMANO...	kg	7'059,18	0,16	1'129,47
25 24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. SOMMANO...	kg	5'912,98	0,27	1'596,50
26 NP 01	Rimozione di fascia di pavimentazione della larghezza media di cm 45 ed una lunghezza massima di m 13,00, previo taglio con frullino o altro attrezzo manuale, demolizione e rimoz ... al piano, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	26,02	208,16
27 NP 02	Ripristino di pavimentazione in linoleum nelle fasce di pavimentazione precedentemente rimosse per l'inserimento delle catene, compresa la rasatura del massetto, la fornitura e pos ... rasporto e la movimentazione dei materiali e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	14,65	117,20
	A R I P O R T A R E				4'829,01

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'829,01
28 NP 05	Consolidamento di elementi in c.a. con nastri unidirezionali in fibra di carbonio da 300 gr/mq, applicati stucco epossidico e resina epossidica fluida da impregnazione- Prezzo a mq di nastro applicato	mq	4,00	7,70	30,80
29 OPE 01	Operaio specializzato	ore	48,00	32,27	1'548,96
30 OPE 02	Operaio qualificato	ore	118,00	30,01	3'541,18
31 OPE 03	Manovale	ore	46,00	27,06	1'244,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro				11'194,71
	T O T A L E euro				11'194,71
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				11'194,71
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
	Certificato N.1 del 21/02/2015 euro				4'200,00
	Certificato N.2 del 28/09/2015 euro				6'900,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				11'100,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro				11'100,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				94,71
	Macerata, 28/09/2015				
	<p>L'Impresa</p> <p>SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (Sardellini Geom. Piero)</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Dott. Ing. Luigino DEZI Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560</p> </div> <p style="font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">VISTO IL RUP</p> 				
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

STATO FINALE DEI LAVORI
(SICUREZZA SPECIALE)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 02.05.014*	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per il trasporto a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente	SOMMANO...	m ²	78,70	13,67	1'075,83
2 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)	SOMMANO...	m	42,00	10,20	428,40
3 26.01.01.25. 001	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese	SOMMANO...	m ²	98,46	5,36	527,75
4 OPE 01	Operaio specializzato	SOMMANO...	ore	9,00	32,27	290,43
5 OPE 02	Operaio qualificato	SOMMANO...	ore	24,00	30,01	720,24
6 PSIC_01	Realizzazione di tunnel protetto copro B	SOMMANO...	C.po	1,00	3'400,00	3'400,00
7 PSIC_02	Installazione di illuminazione di segnalazione	SOMMANO...	C.po	1,00	223,80	223,80
Parziale LAVORI A MISURA euro						6'666,45
TOTALE euro						6'666,45
A RIPORTARE						

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>				
	LAVORI A MISURA euro				6'666,45
	TOTALE euro				6'666,45
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>					
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				6'666,45	
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:					
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>					
	Certificato N.1 del 21/02/2015 euro				4'500,00	
	Certificato N.2 del 28/09/2015 euro				2'100,00	
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				6'600,00	
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro				6'600,00	
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				66,45	
	<p>Macerata, 28/09/2015</p> <p style="text-align: right;"> SARDELLINI COSTRUZIONI Srl L'Amministratore Unico (<i>Sardellini Geom. Luigi</i>) </p> <p> L'Impresa Il Direttore dei Lavori </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Dott. Ing. Luigino DEZI Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560 </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">VISTO IL RUP</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>					
	A RIPIANTARE					

ASUR MARCHE

Area Vasta Territoriale 3 Macerata

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

O G G E T T O: LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA

R E S P O N S A B I L E D E L P R O C E D I M E N T O: I N G. G I A N L U C A P E L L E G R I N I

C O M M I T T E N T E: A S U R M A R C H E A R E A V A S T A 3

I M P R E S A: S A R D E L L I N I C O S T R U Z I O N I s.r.l - Via Pò 52 - 62100 Macerata

C O N T R A T T O: i n d a t a 27/11/2014

R I B A S S O D ' A S T A: -22.599

I M P O R T O P R O G E T T O (S T I M A D E L L A S O M M A U R G E N Z A): e u r o 100.000,00

OGGETTO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Padiglione Centrale ex-crass di Macerata
CUP F82G14000560005 CIG 5775153F01

APPALTATORE

Con verbale in data 03.06.2014 a seguito di espletamento della relativa procedura negoziata, i lavori descritti in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Sardellini Costruzioni srl di Macerata che ha offerto un ribasso del 22.599 % sui prezzi del prezzario Marche 2013.

CONTRATTO

Contratto sottoscritto dall'Appaltatore in in data 27/11/2014

SPESA PRESUNTA PER I LAVORI

L'importo presunto dei lavori di somma urgenza è stato stimato in 100.000 (art. 2 del contratto) precisando che in ogni caso si sarebbero dovuti contabilizzare tutti quei lavori necessari al completamento della somma urgenza.

A seguito delle evoluzioni dei dissesti riscontrate in corso d'opera (verbale 16.02.2015 - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate del 16.04.2015 - verbale del 20.04.2015) con successiva lettera prot. 16912 del 26.05.2015 il RUP ribadiva che la spesa autorizzata per tali interventi di somma urgenza doveva tener conto del limite massimo di 200.000 €.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da Ing. Gianluca Pellegrini

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Prof. Ing. Luigino Dezi

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era Ing. Massimo Conti

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori di somma urgenza furono consegnati con verbale il giorno 06.08.2014, alla presenza dell' Appaltatore - Arch. Tobia Sardellini; Direttore dei Lavori - Ing. Luigino Dezi; RUP - Ing. Gianluca Pellegrini.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 24 del capitolato speciale di appalto in 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna (art. 11 del contratto).

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 03.11.2014.

Sospensione N°1 del 11.08.2014

Ripresa n° 1 del 10.11.2014 (termine fine lavori prorogato al 13.02.2015)

Sospensione N°2 del 15.11.2014 per maltempo

Ripresa n° 2 del 20.11.2014 per maltempo (termine fine lavori prorogato al 18.02.2015)

Sospensione N°3 del 01.12.2014 per maltempo

Ripresa n° 3 del 09.12.2014 per maltempo (termine fine lavori prorogato al 26.02.2015)

Sospensione N°4 del 21.02.2015 (a seguito di indagini sull'evoluzione del q. fessurativo)

Ripresa n° 4 del 27.07.2015 (termine fine lavori prorogato al 24.09.2015)

Sempre dal medesimo art. 11 del contratto si stabiliva che non sono previste penali.

Si precisa che a seguito dei sondaggi svolti in febbraio e precisamente nella giornata del 21.02.2015, (verbale 16.02.2015 - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate del 16.04.2015 - verbale del 20.04.2015), con successiva lettera prot. 16912 del 26.05.2015 il RUP consentiva di eseguire gli ulteriori lavori per la messa in sicurezza.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei lavori, con certificato in data 21.09.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 21.09.2015 e pertanto in tempo utile.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu redatto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 03.12.2015 n. 1 approvato in data 16/06/2015
Determina ASUR n.429

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 5 (cinque)

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto che sono state efficacemente migliorate in corso d'opera, e alle disposizioni del Direttore dei lavori a seguito dei rilievi e sondaggi effettuati a causa dell'aggravarsi del quadro fessurativo. In particolare è da rilevare che durante tutta l'esecuzione dei lavori ci sono stati notevoli fermi delle attività proprio per rendere possibile la prosecuzione delle normali attività amministrative e mediche presenti nel complesso in cui la ditta operava. Tutte le lavorazioni rumorose sono state sospese al mattino e svolte nel pomeriggio. Inoltre la creazione di spazi protetti per gli utenti, scala, tunnel ecc. hanno costretto la ditta ad operare con ritmi più lenti rispetto ad un normale cantiere. Si pensi solo alle modalità di ingresso e uscita delle maestranze e la possibilità di lavorare al mattino o pomeriggio a seconda della lavorazione. Inoltre durante l'esecuzione dei lavori e a seguito di richieste del personale sono stati realizzati, miglioramenti dei passaggi, come ad esempio la posa in opera dell'impianto di illuminazione integrativo rispetto a quello esistente, la realizzazione del ponteggio di protezione lungo la scala centrale, il ripristino continuo delle schermature del tunnel ecc.

Le previsioni iniziali per i lavori di somma urgenza riguardavano la messa in sicurezza dei corpi B, E1, E2. I lavori hanno avuto inizio nel corpo B in quanto interessato da fessure e dissesti più evidenti. Nel corso dei lavori, anche a seguito dell'evoluzione del quadro fessurativo, è stata condotta una campagna di rilievi e indagini, con sondaggi sulle pareti e sui solai dei corpi B, E1, E2 e D che ha evidenziato notevoli distacchi, dei muri di spina rispetto alle facciate come sintetizzato nella relazione del 16.04.2015. Alla luce dei risultati dei rilievi e delle indagini si è ritenuto indispensabile completare gli interventi previsti nel corpo B con la posa di ulteriori catene.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 28.09.2015 e riporta le seguenti annotazioni:

a) Importo lordo dei lavori eseguiti (al netto di sic. Gen e spec.)	€	165.302,44
b) Ribasso d'asta del 22.599 %		€- 37.356,70
c) Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (a-b)	€	
127.945,74		
d) Importo sicurezza generale	€	11.194,71
e) Importo sicurezza speciale	€	6.666,45
f) Acconti lavori corrisposti all'Impresa (I e II SAL)	€	127.300,00
g) Acconti sic. Gen. corrisposti all'Impresa (I e II SAL)	€	11.100,00

- h) Acconti sic. Gén. corrisposti all'Impresa (I e II SAL) € 6.600,00
i) Resta il credito netto dell'Impresa
Lavori (645,74 €) + Sic. Gen (94,71 €) + Sic. Spec. (66,45 €) € 806,90

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Macerata mediante posizione n. 27832160.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 28.09.2015 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) Geom. Angelo Farabollini - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di somma urgenza, presso il padiglione Centrale Ex Crass – Corpo B e indagini strutturali.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA eseguiti dall'Impresa Sardellini Costruzioni con sede in Via Po 52, in base al contratto in data 27/11/2014 di repertorio e atto di sottomissione in data 03.12.2014 n. 1 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) Importo lordo dei lavori eseguiti (al netto di sic. Gen e spec.)	€	165.302,44
b) Ribasso d'asta del 22.599 %		€- 37.356,70

c) Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (a-b)	€127.945,74
d) Importo sicurezza generale	€ 11.194,71
e) Importo sicurezza speciale	€ 6.666,45
f) Acconti lavori corrisposti all'Impresa (I e II SAL)	€ 127.300,00
g) Acconti sic. Gen. corrisposti all'Impresa (I e II SAL)	€ 11.100,00
h) Acconti sic. Gen. corrisposti all'Impresa (I e II SAL)	€ 6.600,00
i) Resta il credito netto dell'Impresa	
Lavori (645,74 €) + Sic. Gen (94,71 €) + Sic. Spec. (66,45 €)	€ 806,90

Resta il credito dell'Impresa in nette € 806,90 (diconsi euro ottocentosei/90) che possono essere corrisposte all'Impresa Sardellini Costruzioni a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Macerata, li 12.10.2015

Per la Ditta

SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.

SARDELLINI COSTRUZIONI Srl
Procuratore
(Sardellini Arch. Obbia)


Per la Direzione Lavori

Ing. Luigino Dezi



Dott. Ing. Luigino D E Z I
Ordine Ingegneri Prev. Ancona n. 560

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Gianluca Pellegrini



AO. 5



ASUR MARCHE

Area Vasta Territoriale 3 Macerata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA. CUP F82G14000560005 - CIG 5775153F01

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. GIANLUCA PELLEGRINI

COMMITTENTE: ASUR MARCHE AREA VASTA 3

IMPRESA: SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l - Via Pò 52 - 62100 Macerata

CONTRATTO: in data __/__/__

RELAZIONE DI SINTESI SUI LAVORI ESEGUITI

I lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto che sono state efficacemente migliorate in corso d'opera, e alle disposizioni del Direttore dei Lavori a seguito dei rilievi e sondaggi effettuati a causa dell'aggravarsi del quadro fessurativo. In particolare è da rilevare che durante tutta l'esecuzione dei lavori ci sono stati notevoli fermi delle attività proprio per rendere possibile la prosecuzione delle normali attività amministrative e mediche presenti nel complesso in cui la ditta operava. Le previsioni iniziali per i lavori di somma urgenza riguardavano la messa in sicurezza dei corpi B, E1, E2. I lavori hanno avuto inizio nel corpo B in quanto interessato da fessure e dissesti più evidenti.

Durante l'esecuzione dei lavori, grazie alla maggior visibilità dei particolari costruttivi strutturali si sono potute operare scelte migliorative sull'intervento in copertura. La soluzione iniziale, che prevedeva lo smantellamento dell'intera copertura e la sostituzione delle capriate, seppure più efficace, da un lato è risultata troppo onerosa e quindi non compatibile con l'importo massimo previsto nel contratto di somma urgenza, dall'altro di difficile esecuzione durante la stagione invernale e con il resto dell'immobile in esercizio. È stato invece optato per un intervento di rinforzo delle capriate esistenti, che richiede l'apertura della copertura solo in corrispondenza degli appoggi delle capriate e quindi facilmente realizzabile anche in presenza di condizioni meteoriche avverse. Un tale intervento è risultato inoltre compatibile con l'esercizio dell'immobile, il quale, seppure liberato nei locali direttamente interessati dai lavori, doveva mantenere tutte le funzioni, compresi i servizi per gli utenti esterni, come ad esempio le attività ambulatoriali.

L'intervento ha previsto il rinforzo delle capriate del tetto e l'inserimento di catene all'estradosso del solaio del primo piano. Il rinforzo delle capriate è stato ottenuto con due

putrelle metalliche, inserite da aperture praticate nei due lati della copertura, mediante le quali è stato realizzato un sostegno intermedio ai due puntoni delle capriate stesse. Il sostegno intermedio è stato forzato fino a recuperare la freccia accumulata dai puntoni delle capriate. Per contenere la spinta sulle pareti esterne, le putrelle sono state collegate tra loro a due a due con un tirante nella parte centrale. L'intervento è schematizzato nelle Tavole n. 1.1 e 1.2 allegate alla presente relazione.

Nel corso dei lavori, avendo rilevato un aggravamento del quadro fessurativo sulle intersezioni tra i muri di spina e le pareti esterne ed il distacco di ampie porzioni di intonaco, il DL ha ordinato un'immediata campagna integrativa di indagini per valutare l'entità dei dissesti. Le indagini condotte hanno avuto come obiettivo l'esecuzione di sondaggi mirati alla ispezione del grado di ammorsamento dei muri di spina con le pareti esterne e di altri punti critici, il rilievo dei fuori piombo delle pareti e il controllo delle camorcanne. Le indagini hanno interessato anche i corpi D, E1 ed E2.

Per verificare l'ammorsamento dei muri di spina alle pareti esterne è stato demolito l'intonaco negli angoli tra i due muri, mettendo a nudo le murature. In alcuni locali sono stati asportati gli intonaci delle camorcanne al fine di verificarne lo stato di conservazione degli appoggi.

Nel corpo B tutti i muri di spina presentano un distacco dalle pareti esterne che in alcuni casi ha raggiunto i 7 cm. Tale distacco, originato dalla spinta delle capriate originarie che presentavano uno schema spingente, si è aggravato dopo la sostituzione delle capriate nel corso dei lavori di miglioramento sismico. Le nuove capriate sono infatti risultate maggiormente spingenti rispetto a quelle esistenti, per la sostituzione della catena in legno con un tirante metallico in posizione più rialzata, ed i puntoni di falda hanno subito vistose inflessioni. Le pareti esterne dei vari corpi sono inoltre interessate da fuori piombo di circa 1 cm per metro di altezza.

I corpi E1 ed E2, oltre a presentare le pareti fuori piombo sulla corte interna, sono interessate da fessurazioni derivanti dall'azione spingente delle volte presenti sui corridoi. Tale azione ha anche prodotto distacchi e fessurazioni longitudinali sulle voltine stesse e sul pavimento al primo piano. Il corpo D è risultato anch'esso interessato dai distacchi tra i muri di spina e le pareti esterne e dai fuori piombo delle facciate. Nella Tavola n. 2 sono evidenziati i sondaggi eseguiti, i fuori piombo e le fessurazioni osservate.

Le ispezioni visive sono state estese anche al piano terra, dove tuttavia non sono stati rilevati dissesti. Ai fuori piombo osservati sulle pareti esterne non corrispondono lesioni o distacchi interni.

Alla luce dei risultati dei rilievi e delle indagini, si è ritenuto indispensabile completare gli interventi previsti nel corpo B con la posa in opera di ulteriori catene posizionate al disotto del piano di appoggio delle capriate al fine di realizzare un collegamento tra le due facciate ed impedire il progredire degli spostamenti orizzontali delle pareti esterne. Nella Tavola n. 3 allegata sono evidenziati gli ulteriori lavori eseguiti.

Con le risorse a disposizione non è stato possibile completare l'intervento con la ripresa a scuci e cucì delle intersezioni murarie per il ripristino dell'ammorsamento tra i muri di spina e le pareti di facciata, seppure ritenuto necessario per la messa in sicurezza definitiva.

Per quanto riguarda i lavori previsti nei corpi E1 ed E2, si conferma la necessità di eseguire gli interventi di ripristino strutturale mirati al confinamento della compagine muraria, che potrà essere conseguito con catene ai due livelli.

I risultati dei sondaggi eseguiti hanno mostrato infine che anche il corpo D è interessato da fenomeni di distacco tra i muri di spina e le pareti esterne tali da richiedere un intervento di messa in sicurezza.

I lavori di ripristino delle intersezioni murarie con interventi di cucì e scuci, individuati a seguito della campagna di sondaggi, seppure urgenti e indispensabili per l'agibilità dell'edificio, saranno oggetto di un intervento successivo.

Allegate le seguenti tavole:

TAV 1.1

TAV. 1.2

TAV. 2

TAV. 3

Ancona 02.04.2016



Il Direttore dei Lavori

Prof. Ing. Luigino Dezi


Prof. Ing. Luigino Dezi
Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 561



A.S.U.P.R.
 AREA VASTAZIONE 3 MC
 - 8 APR. 2016
 POSTA NAZIONALE

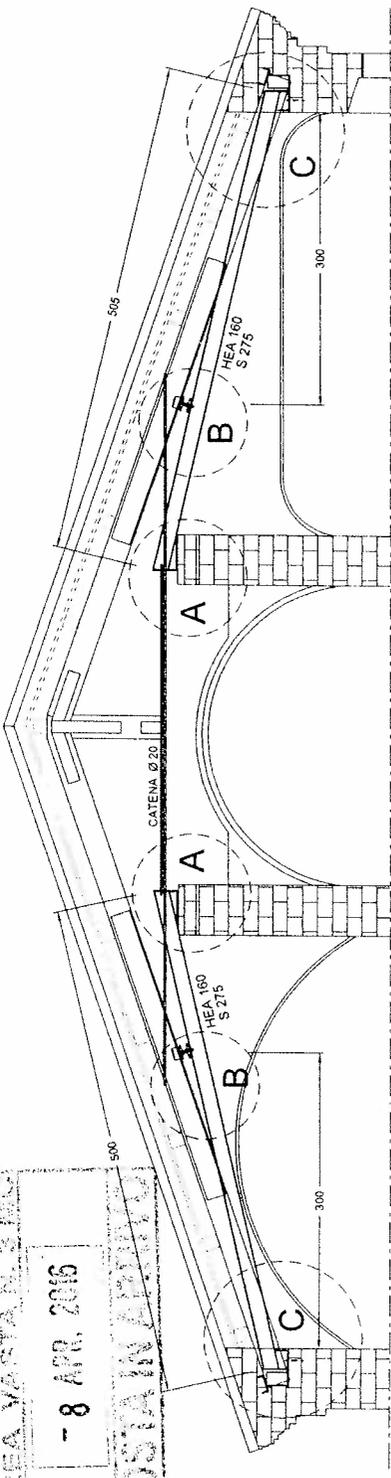

SEZIONE TRASVERSALE - CAPRIATA TIPO COPERTURA (1:50)

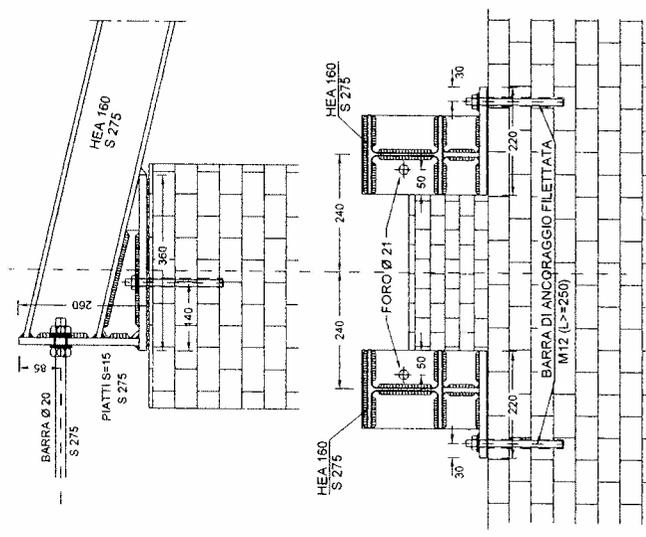


PARTICOLARE "A" (1:10)



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Padiglione Centrale
 ex Crass di Macerata

Prof. Ing. Luigino Dezi
 TAV 1.1
 DATA:

A.S.U.R.
 AREA VASTA N.3 MC
 - 8 APR. 2016
 POSTA IN ARRIVO

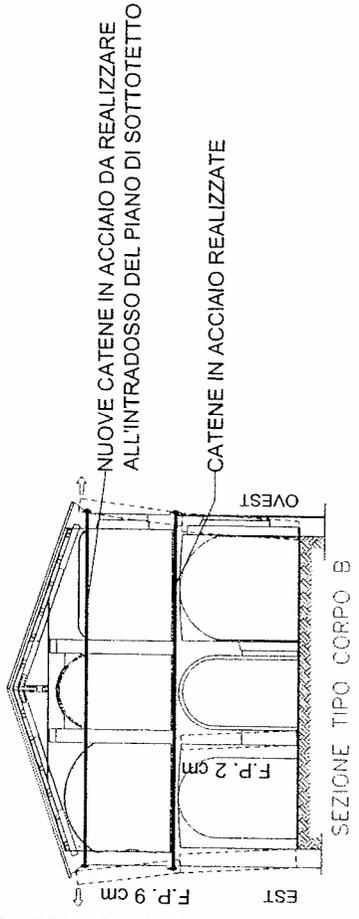

NUOVE CATENE IN ACCIAIO DA REALIZZARE
 ALL'INTRADOSSO DEL PIANO DI SOTTOTETTO

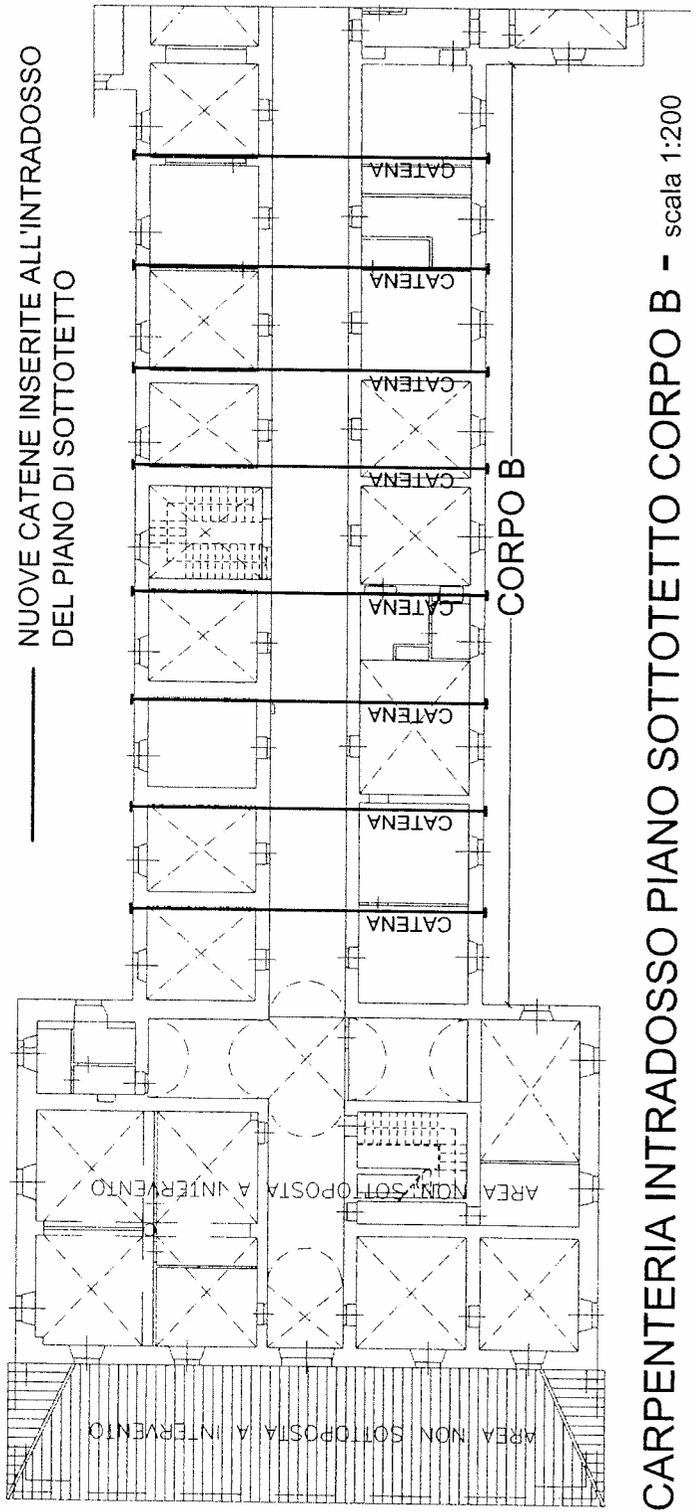

CARPENTERIA INTRADOSSO PIANO SOTTOTETTO CORPO B - scala 1:200

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Padiglione Centrale ex Cross di Macerata	Prof. Ing. Luigino Dezi	TAVOLA: 3	DATA:
---	-------------------------	--------------	-------

FATTURA ELETTRONICA

u = 65/€
(2° SAL)
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0EW9K
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00365020437
Codice fiscale: 00365020437
Denominazione: SARDELLINI COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PO
Numero civico: 52
CAP: 62100
Comune: MACERATA
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0733283801
Fax: 0733283830
E-mail: amm@sardellinicostruzioni.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-12+02:00** (12 Ottobre 2015 02:00:)
Numero documento: **65/E**
Importo totale documento: **55998.00**
Causale: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2015-10-12+02:00** (12 Ottobre 2015 02:00:)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F82G14000560005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5775153F01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SECONDO SAL - QUOTA LAVORI**
Valore unitario: **36900.00**
Valore totale: **36900.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SECONDO SAL - QUOTA ONERI PER SICUREZZA GENERALI**
Valore unitario: **6900.00**
Valore totale: **6900.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SECONDO SAL - QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI**
Valore unitario: **2100.00**
Valore totale: **2100.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **45900.00**
Totale imposta: **10098.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SARDELLINI COSTRUZIONI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **45900.00**
Istituto finanziario: **BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO**
Codice IBAN: **IT33S0849113400000120100264**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

u^o = 66/E
(S.F.)
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0EW9M
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00365020437
Codice fiscale: 00365020437
Denominazione: SARDELLINI COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PO
Numero civico: 52
CAP: 62100
Comune: MACERATA
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0733283801
Fax: 0733283830
E-mail: amm@sardellinicostruzioni.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-12+02:00** (12 Ottobre 2015 02:00:)
Numero documento: **66/E**
Importo totale documento: **984.42**
Causale: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2015-10-12+02:00** (12 Ottobre 2015 02:00:)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F82G14000560005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5775153F01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE - QUOTA LAVORI**
Valore unitario: **645.74**
Valore totale: **645.74**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE - QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI**
Valore unitario: **94.71**
Valore totale: **94.71**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE - QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI**
Valore unitario: **66.45**
Valore totale: **66.45**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **806.90**
Totale imposta: **177.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SARDELLINI COSTRUZIONI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **806.90**
Istituto finanziario: **BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO**
Codice IBAN: **IT33S0849113400000120100264**

FATTURA ELETTRONICA

Prog. DEZI

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000949861**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **OSH9XI**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00331480426**
Codice fiscale: **DZELGN49C24F622L**
Denominazione: **DEZI LUIGINO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DI PASSO VARANO**
Numero civico: **306/B**
CAP: **60131**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0712900501**
Fax: **0712855024**
E-mail: **studezi@tin.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02175860424**
Denominazione: **ASUR MARCHE - AREA VASTA N.3**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BELVEDERE SANZIO**
Numero civico: **1**
CAP: **62100**
Comune: **MACERATA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-23** (23 Febbraio 2016)
Numero documento: **2/01**
Importo totale documento: **24545.22**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **3869.04**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **744.05**
Imponibile previdenziale: **18601.17**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **773.81**
Imponibile previdenziale: **19345.22**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **00000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F82G14000560005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5775153F01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SOMMA URGENZA SU PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS DI MACERATA. COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI**
Valore unitario: **20119.03**
Valore totale: **20119.03**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **20119.03**
Totale imposta: **4426.19**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LUIGINO DEZI**
Modalità : **MP05** (bonifico)
Importo: **20676.18**
Istituto finanziario: **BANCA MEDIOLANUM**
Codice IBAN: **IT45J0306234210000000467944**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Ing. Conti

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSPCSNL65D44F520M**
 Progressivo di invio: **CM00000013**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **0SH9XI**
 Telefono del trasmittente: **07155405**
 E-mail del trasmittente: **studio.serenella@iol.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01787000445**
 Codice fiscale: **CNTMSM76B19A252Y**
 Nome: **MASSIMO**
 Cognome: **CONTI**
 Titolo: **Ing.**
 Codice EORI: **IT01787000445**
 Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FERMO**
 Provincia di competenza dell'Albo: **FM**
 Numero iscrizione all'Albo: **374**
 Data iscrizione all'Albo: **2006-01-25** (25 Gennaio 2006)
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Torresi**
 Numero civico: **8**
 CAP: **63857**
 Comune: **AMANDOLA**
 Provincia: **FM**
 Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **ing_massimoconti@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02175860424**
 Denominazione: **ASUR MARCHE AREA VASTA 3**

Dati della sede

Indirizzo: **Largo Belvedere Sanzio**
 CAP: **62100**
 Comune: **MACERATA**
 Provincia: **MC**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-03-15** (15 Marzo 2016)
 Numero documento: **1/PA**
 Importo totale documento: **8260.42**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **ASUR AREA VASTA 3 MACERATA**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **1302.08**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **6260.02**
 Imponibile previdenziale: **250.40**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**
 Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **6510.42**
 Imponibile previdenziale: **260.42**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
 Data ordine di acquisto: **2016-03-15** (15 Marzo 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **F82G14000560005**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **5775153F01**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Onorario e spese per lavori di somma urgenza su padiglione centrale ex crass di Macerata - Compenso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione**
 Quantit  : **1.0000000**
 Valore unitario: **6260.0200000**
 Valore totale: **6260.0200000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **6770.84**
Totale imposta: **1489.58**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-15** (15 Marzo 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **6958.34**
Istituto finanziario: **BANCA DELL'ADRIATICO VIA MONTEBELLO 57/59 ANCONA 60122**
Codice IBAN: **IT56E0574802607100000009925**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2554327	Data richiesta	23/02/2016	Scadenza validità	22/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	00365020437
Sede legale	VIA PO, 52 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto **Prof. Ing. DEZI LUIGINO** nato il 24.03.1949 a Monte San Martino (MC) residente ad Ancona in Via Ranieri 51, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità al fine della liquidazione dell'importo relativo al saldo per l'incarico di DIREZIONE DEI LAVORI di "Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata" - CUP F82G14000560005 - CIG 5775153F01

DICHIARA

- 1) di non essere tenuto al rilascio del Durc. in quanto:
è professionista singolo senza avere personale dipendente
- 2) di essere in regola con il versamento dei propri contributi versati presso:
INPS GESTIONE SEPARATA
- 3) di impegnarsi ad informare codesta Amministrazione di qualsiasi variazione futura circa quanto sopra dichiarato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Ancona lì 27.01.2016

IL dichiarante

Prof. Ing. Luigino Dezi

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato: fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto PROF. ING: LUIGINO DEZI, o Professionista singolo, C.F. DZE LGN 49C24 F622L, P.IVA 00331480426, quale affidatario dell'incarico di "Direttore dei lavori" di "Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata" – CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut. n. 8/2010) ovvero

che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN **IT45J0306234210000000467944** esistente presso Banca Mediolanum

aperto appositamente il giorno _____

già esistente e utilizzato per il presente incarico dal giorno _____

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti: (art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010)

- Prof. Ing. Luigino Dezi nato a M. S. Martino (MC) il 24.03.1949 e residente in Ancona Via Ranieri 51, CF DZE LGN 49C24 F622L

che si impegna inoltre a: (apporre una crocetta)

a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) ~~inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancite dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);~~

c) registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c. 1 L. 136/2010);

d) riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al numero sopra riportato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al numero sopra riportato, se del caso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);

e) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 27.01.2016

Firma del Professionista

.....
 Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante.

Allegati: fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Ing. **MASSIMO CONTI**, nato **AMANDOLA** il 19.02.1976, residente a **AMANDOLA** in Via **SAN RUFFINO 8**, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità al fine della liquidazione dell'importo relativo al saldo per **per l'espletamento dell'incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di "Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata" – CUP F82G14000560005 – CIG 5775153F01**

DICHIARA

- 1) di non essere tenuto al rilascio del Durc. in quanto:
è professionista singolo senza avere personale dipendente
- 2) di essere in regola con il versamento dei propri contributi versati presso:
INPS GESTIONE SEPARATA
- 3) di impegnarsi ad informare codesta Amministrazione di qualsiasi variazione futura circa quanto sopra dichiarato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

AMAMNDOLA li 27.01.2016

IL dichiarante ING. MASSIMO CONTI

Firma

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax al n. _____

Allegato: fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido.

Asp. 14



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ING: MASSIMO CONTI, o Professionista singolo/associato o facente parte di una o società (di ingegneria o di professionisti) C.F./P.IVA CNTMSM76B19A252Y - 01787000445 quale affidatario dell'incarico di "Coordinamento Sicurezza in Es. " dei lavori di "Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale Ex Crass di Macerata" - CUP F82G14000560005 - CIG 5775153F01, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut.n. 8/2010) ovvero

X che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN _____ esistente presso BANCA DELL'ADRIATICO VIA MONTEBELLO 60122 - VIA MONTEBELLO, 57/59 - ANCONA

aperto appositamente il giorno _____

già esistente e utilizzato per il presente incarico dal giorno _____

X che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti: (art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010)

ING. MASSIMO CONTI NATO AD AMANDOLA (FM) RESIDENTE IN VIA SAN RUFFINO 8 AMANDOLA - CNTMSM76B19A252Y

X che si impegna inoltre a: (apporre una crocetta)

a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) ~~inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancite dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);~~

Xc) registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c.1 L. 136/2010);

Xd) riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al numero sopra riportato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al numero sopra riportato, se del caso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);

Xe) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 27.01.2016

Firma del Professionista

.....
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante.

Allegati: fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.
