

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1187/AV5 DEL 30/11/2015

Oggetto: Completamento lavori blocco operatorio osp.le Mazzoni AP – Adeguamento antincendio zone comuni tra vecchio e nuovo blocco e fornitura e posa in opera telecamere.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

Di assumere la somma complessiva di €. 43.352,47 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 38**;

Di liquidare alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl la somma complessiva di €. 43.352,47, di cui €. 39.411,34 per fornitura e posa in opera e lavori ed €. 3.941,13 per IVA 10%, relativa ai lavori di completamento della zona filtro e del collegamento orizzontale delle vecchie sale operatorie ed alla fornitura e posa in opera di telecamere per le sale operatorie dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/A del 20/05/2015, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Di imputare la somma complessiva di €. 43.352,47 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 38**;

Di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quanto altro di competenza all'U.O. Attività Economico-Finanziarie;

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA N°5
(Avv. Giulietta Capocasa)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC. P.N.O.A.T.

Normativa di riferimento

- L. R. n.13/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”;
- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- DPR 207 del 05/10/2010 avente ad oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Determine DG ASUR n. 785/05 e n. 254/06 ASURDG e nota ASUR Prot. 6187 del 29/06/2006 (concernenti la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative e relativa proroga);

Premesso che:

- con DGRM n. 1140 del 22/12/2014, in attesa dell' assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del SSR e quindi anche l'ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi anno 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
- con DGRM n. 346 del 28/04/2015, ad integrazione della DGRM n. 1440 citata, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del SSR alla gestione provvisoria del budget da destinare agli investimenti con fondi correnti di cui al D.Lg. 118/11, assegnando all'ASUR un tetto di 24.099.968,05 euro, pari all'80% del valore di acquisto di € 30.124.960,06 in cui si prevede che l'ASUR presenti il piano degli investimenti coerenti con il tetto assegnato;
- con nota Prot. 19.123 dell' 11/06/2015 la Direzione Generale ha assegnato a ciascuna Area Vasta un limite di spesa provvisorio per gli investimenti con fondi correnti per l'anno 2015, costruito sulla base del budget di costi autorizzato per l'anno 2014 e comprensivo delle progettualità approvate con DGR 986/2014 non concluse nell'esercizio 2014, da realizzarsi entro il 31/12/2015;
- con Determina 511ASURDG dell' 08/07/2015 la Direzione Generale recepisce il contenuto della DGRM n. 346 del 28/04/2015, assegna ai Direttori di Area Vasta i tetti di spesa per investimenti con fondi correnti e autorizza le Direzioni di Area Vasta alla realizzazione del piano degli investimenti provvisori 2015 stabilendo che i tetti di spesa per gli investimenti con fondi correnti delle Aree Vaste e del piano degli investimenti provvisorio 2015, vengano aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche tenendo conto delle risultanze del report di contabilità del terzo trimestre 2015;

Per quanto sopra:

Visto il piano degli investimenti per l'esercizio 2015 redatto dall'Area Vasta n. 5 che comprende n. 9 lavori urgenti e tra questi è presente l'intervento riferito all'adeguamento antincendio zone comuni tra vecchio e nuovo blocco operatorio;

Preso atto che con ordine di servizio n. 4/A del 20/05/2015 (all. n. 1), il RUP e la Direzione Lavori avendo ritenuto necessario, a completamento dei lavori, intervenire nei percorsi di servizio attigui agli ascensori/montacarichi ad uso esclusivo del blocco operatorio, realizzare un filtro a prova di fumo nel percorso sporco in comune tra vecchio e nuovo blocco e fornire e porre in opera n. 10 telecamere da posizionare nelle sale operatorie n. 1-2-3-4-5 ordinavano alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl, esecutrice dei lavori del blocco operatorio, di provvedere alla fornitura e posa in opera delle telecamere e alle lavorazioni dettagliate nel computo metrico, allegato all'ordine di servizio (all. n. 2);

Vista la Rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori in economia e il Certificato con il quale la Direzione Lavori attesta la regolare esecuzione delle suddette lavorazioni e della fornitura e posa in opera di telecamere ritenendone ammissibile il pagamento per €. 39.411,34 + IVA 10% così come da computo consuntivo (all. n. 3);

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice (all. n. 4);

Preso atto che l'impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo ha emesso fattura per complessivi €. 43352,47, di cui €. 39.411,34 per lavori, fornitura e posa in opera ed €. 3.941,13 per IVA 10% da versare ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. A/ter del DPR 633/1972, relativa ai lavori di completamento della zona filtro e del collegamento orizzontale delle vecchie sale operatorie ed alla fornitura e posa in opera di telecamere per le sale operatorie dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/A del 20/06/2015;

PROPONE

Di assumere la somma complessiva di €. 43.352,47 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 38**;

Di liquidare alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl la somma complessiva di €. 43.352,47, di cui €. 39.411,34 per fornitura e posa in opera e lavori ed €. 3.941,13 per IVA 10%, relativa ai lavori di completamento della zona filtro e del collegamento orizzontale delle vecchie sale operatorie ed alla fornitura e posa in opera di telecamere per le sale operatorie dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/A del 20/05/2015, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Di imputare la somma complessiva di €. 43.352,47 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 38**;

Di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quanto altro di competenza:

- U.O. Attività Economico-Finanziarie;

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

IL RESPONSABILE DEL UNICO PROCEDIMENTO
(Geom. Remo Bizzarri)

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

I sottoscritti attestano che la spesa derivante dal presente atto è stata prevista con Determina ASUR n. 511 del 08/07/2015.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 36 pagine di cui n.32 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

ALBO PRETORIO

Sistemazione impianto elettrico zona ingresso
impianto meccanico - zona ingresso;

- di provvedere alla realizzazione di un filtro a prova di fumo nel corridoio "sporco" a confine tra il vecchio ed il nuovo blocco operatorio;
- di provvedere alla fornitura e posa in opera di n.10 telecamere nelle sale operatorie n. 1-2-3-4-5;

Per maggiori ragguagli tecnici si rimanda agli elaborati progettuali, uniti al presente ordine. Le eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte con l'impiego di materiali di buona qualità e mano d'opera specializzata idonea per l'intervento a farsi, per un importo presunto dei lavori di € 34.358,96, al netto del ribasso d'appalto pari al 22.84%, oltre IVA come per legge, non contemplato nel quadro economico di spesa, sarà liquidata con altra fonte di finanziamento.

Allegato: COMPUTO ESTIMATIVO

Il pagamento dei lavori eseguiti sarà effettuato alla sua ultimazione, attestata con relativo verbale e certificato di regolare esecuzione.


Redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito alla sottoscritta Direzione Lavori, debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione.

ASCOLI PICENO, lì 20.05.2015

L'impresa
Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

il Direttore dei Lavori
PROMEDIA S.N.
Ing. Raffaele DI GIALLUCA



Visto: il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo BIZZARRI

RM



A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta Territoriale n. 5 - P.O. Ascoli Piceno

Oggetto: **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

Committente: **ASUR REGIONE MARCHE - AREA VASTA N. 5**

Responsabile del Procedimento: **Geom. Remo Bizzarri**

Impresa appaltatrice: **Costruzioni e Restauri Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU) via dei Gelsi n. 28, P.I. 02220160614**

Contratto: **Rep. n. 7997 del 03/10/2012, Registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 205/10/2012 al n° 2388 serie III**

importo di Contratto: **€ 3.028.610,72 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.1: **€ 3.727.052,39 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.2: **€ 3.912.853,65 oltre IVA**

ORDINE DI SERVIZIO N. 4A PER ORDINATIVO LAVORI del 20/05/2015
(art. 152 , Regolamento del codice dei contratti D.P.R. n°207 I 2010)

Visto l'Ordine di Servizio n. 4 del 18/05/2015, ed a seguito di sopralluoghi eseguiti, da questa Direzione Lavori, considerato:

- Che è necessario intervenire in modi rapidi nei percorsi di servizio attigui agli ascensori/montacarichi ad uso esclusivo del blocco operatorio;
- che è necessario realizzare un filtro a prova di fumo nel percorso sporco in comune tra vecchio e nuovo blocco operatorio;
- che è indispensabile fornire e porre in opera n. 10 telecamere da posizionare nelle sale operatorie n. 1-2-3-4-5;

considerato altresì che dette forniture e lavorazioni non sono contemplate nelle progettazioni esecutive;

il Direttore dei Lavori

ORDINA

Alla **società Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.**

- Di provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori:
F.P.O. di armadio per quadri elettrici e canale
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma
Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso
Tinteggiatura
Fornitura e posa in opera di fascia battibarella,
Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale
Infisso di porte in alluminio
Controsoffitto in lamiera di spessore di 5/10.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'000,00
	<p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p>Importo dei Lavori euro ribasso d'appalto (-22,84%)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>ASCOLI PICENO, 05/06/2015</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> INGEGNERI - TERAMO ing. Raffaele DIGIALLUCA 289 DIGIALLUCA NOT. RAFFAELE INGEGNERE Costruzioni e Restauri Menale Antimo s.r.l. </div> <p style="margin-left: 20px;">Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> REGIONE MARCHE - AREA VASTO N. 5 - REGIONE MARCHE S. Benedetto Ascoli Piceno del Tronto </div> <p style="margin-left: 100px; text-align: center;">Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE</p>							13'000,00 -2'969,20 <hr/> 10'030,80
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 15.03.FP11.a - 001	Fornitura e posa in opera di Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalato a Led 1.3 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS 1/3" 1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,05 lux F1.2 in bianco e nero e 0 lux a led accesi • DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto S/N >50dB • Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8-12mm F1.4 • portata led max 30m • porta Ethernet 100 base-T • protocolli supportati ▶ IPv4/IPv6 ▶ http ▶ FTP ▶ DNS ▶ RTSP ▶ RTCP ▶ RTP ▶ TCP ▶ UDP ▶ DHCP ▶ UDP ▶ DDNS ▶ PPPoE ▶ SMTP • protezione con password • Motion Detector • 5 Privacy Zone • uscita video analogica • in/out audio • ingresso di allarme • IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc • consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (AxP) 90x248,8mm. sala operatoria n° 1 sala operatoria n° 2 sala operatoria n° 3 sala operatoria n° 4 sala operatoria n° 5					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'300,00	13'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'000,00
	TOTALE euro							13'000,00
	----- -----							
	A RIPOORTARE							13'000,00

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno


pag. 1


**COMPUTO METRICO
TELECAMERE**


OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI
PICENO

ASCOLI PICENO, 05/06/2015



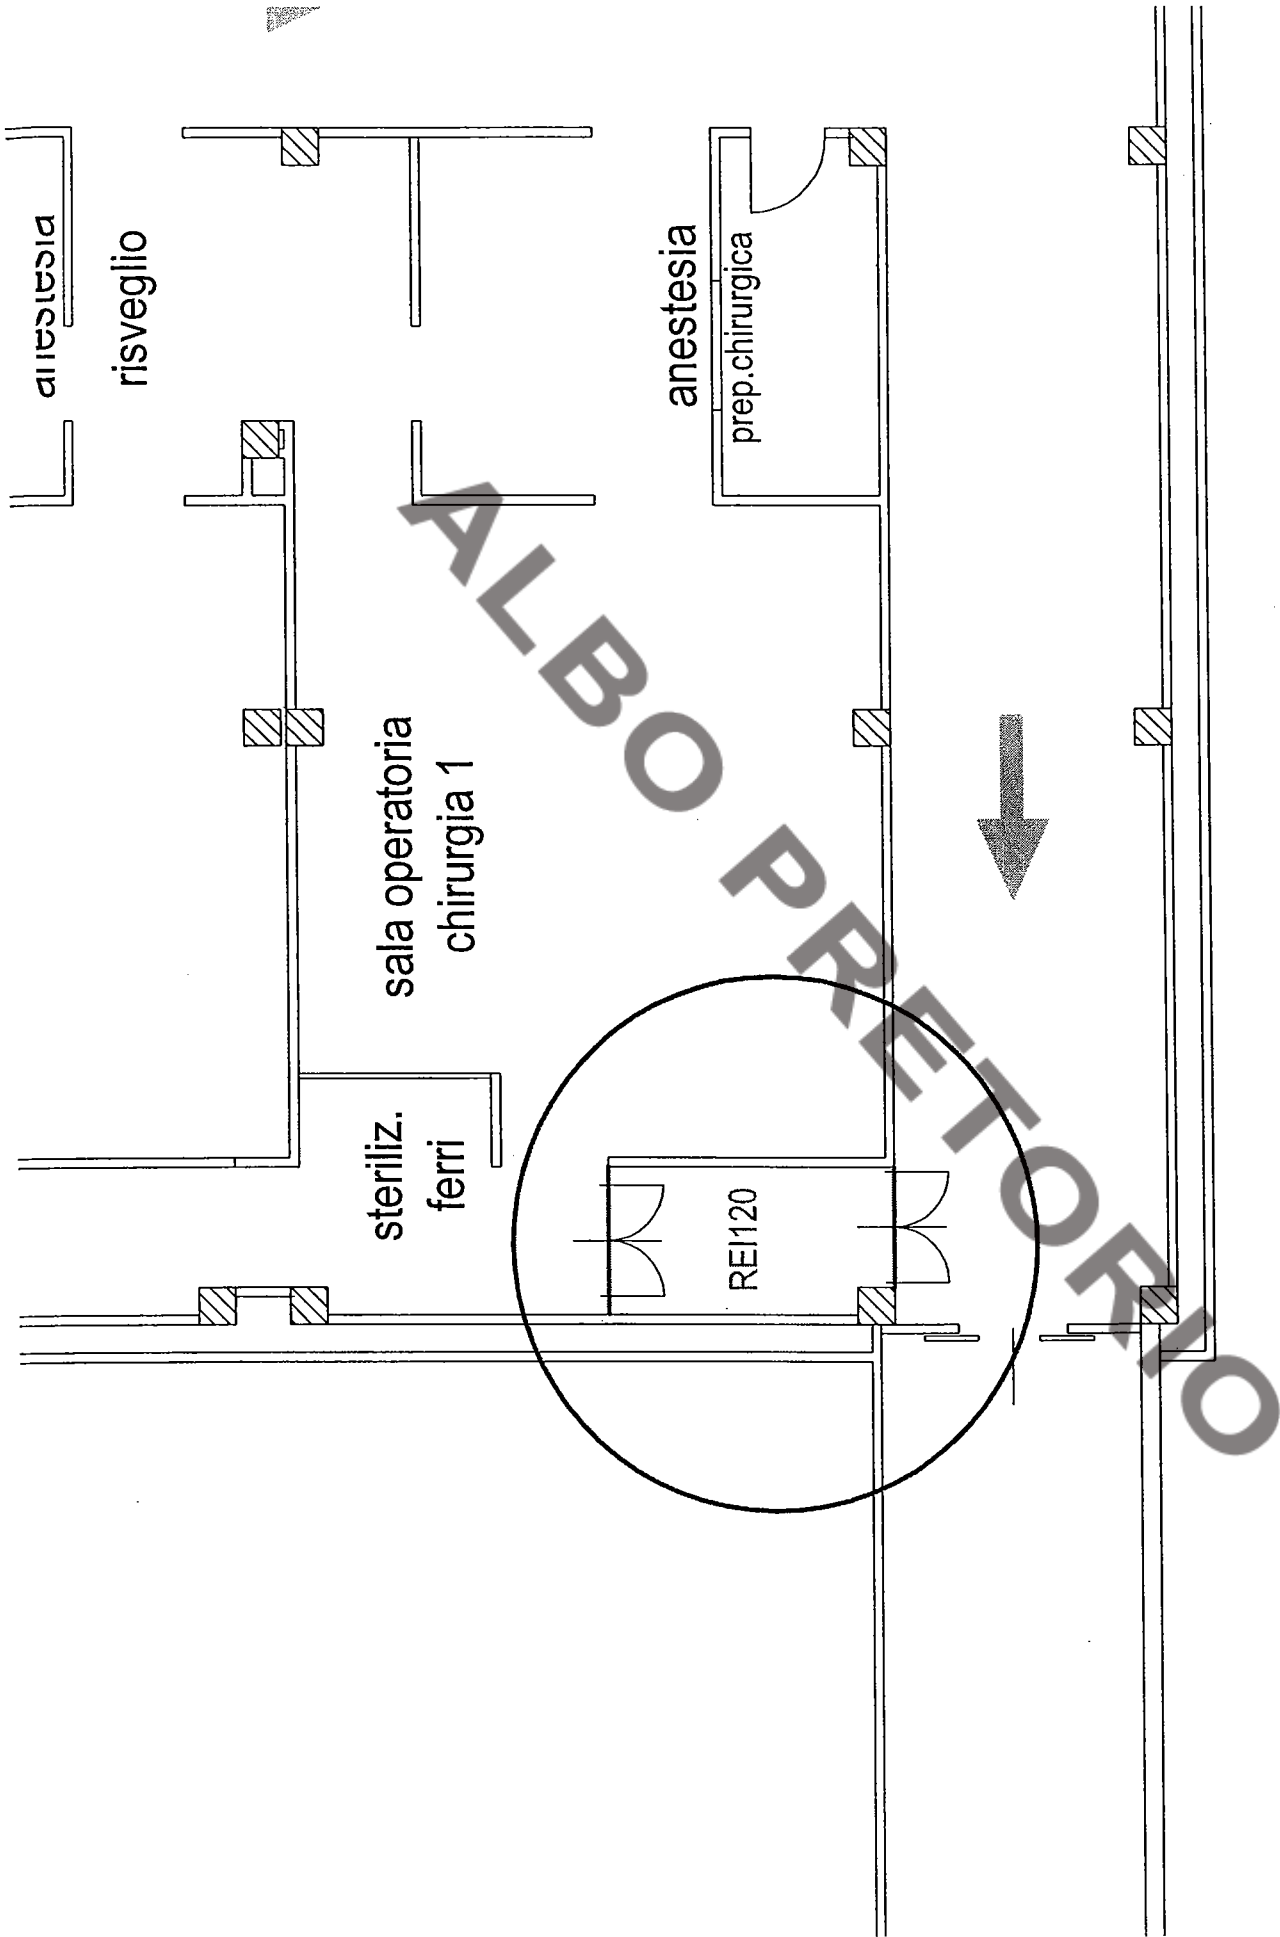

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'835,57
	<p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p>Importo dei Lavori euro ribasso d'appalto (-22,84%)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>ASCOLI PICENO, 27/05/2015</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO ing. Raffaele DI GALLUCA 280 DI GALLUCA dott. RAFFAELE INGEGNERE</p> </div> <p>Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI</p> 						8'835,57	-2'018,04
								6'817,53
	A RIPORTARE							

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 ing. Raffaele DI GALLUCA
 280 DI GALLUCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE



Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE

A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'093,82
16.02.007.00 5 18/05/2015	conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	112,09	224,18
7 16.02.007.00 6 18/05/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	82,00	328,00
8 03.02.FP03 18/05/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte					0,00	61,88	0,00
	SOMMANO mq					0,00	61,88	0,00
9 NP EL 001 19/05/2015	smontaggio di plafoniere, sistemazione linea elettrica, f.p.o. di nuove plafoniere linee elettriche zona filo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
10 12.01.007 19/05/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulizia ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. zona filtro zona filtro	4,00 2,00	1,80 4,50			3,500 3,500	25,20 31,50	
	SOMMANO m²					56,70	14,61	828,39
11 12.01.008 19/05/2015	Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo. Vedi voce n° 10 [m² 56.70]					56,70		
	SOMMANO m²					56,70	6,37	361,18
	A RIPORTARE							6'835,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.03.011 19/05/2015	Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cementa e l'accatastamento del materiale ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. zona filtro		1,80	4,300		7,74		
	SOMMANO m²					7,74	12,96	100,31
2 NP ED 001 06/10/2014	Fornitura e posa in opera di struttura metallica per posizionamento di porte REI - Profilo montante scatolare 70x40x2 in acciaio nero verniciato con due mani di minio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	161,02	322,04
3 03.02.FP102- 19/05/2015	Provvista e posa in opera di parete divisoria REI 120 avente indice del potere fonoisolante Rw = 59 dB - con rapporto di prova di riferimento - e costituita da doppia struttura rea ... aracolpi e battibarella, pensili e travi testaleto, quadri elettrici. Spessore totale della parete mm 137,5. REI 120. zona filtro	2,00	1,80		3,500	12,60		
	SOMMANO mq					12,60	50,11	631,39
4 16.02.004.00 9 18/05/2015	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150. nuovo filtro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	977,34	1'954,68
5 16.02.007.00 4 18/05/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	271,35	1'085,40
6	Accessori per porte antincendio da							
	A RIPORTARE							
								4'093,82

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO METRICO ZONA FILTRO

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO, 27/05/2015

IL TECNICO
ing. Raffaele DI GIACOMO
289/01 DI GIACOMO dot. RAFFAELE
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			8'223,95	
9 12.01.007 11/06/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m²	200,00	14,61	2'922,00
10 12.05.FP103 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di fascia battibarella, altezza 200 mm, spessore 25 mm, composta da un profilo continuo in alluminio e un giunto ammortizzante continuo, sui quali si appl ... to al fuoco C1, M1 e B1. Sono compresi i terminali standard di chiusura e gli angoli esterni. Colore a scelta della D.L.	SOMMANO ml	35,00	33,70	1'179,50
11 12.11.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo acrilovinil ... ento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paraspigolo.	SOMMANO m	21,00	13,66	286,86
12 02.04.008 11/06/2015	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m²	15,00	22,74	341,10
13 09.03.002 11/06/2015	Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata e con superficie totale della l E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.	SOMMANO m²	13,20	260,80	3'442,56
14 09.03.008.00 2 11/06/2015	Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.	SOMMANO m²	13,20	73,12	965,18
15 09.03.011 11/06/2015	Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).	SOMMANO mq	13,20	11,38	150,22
16 07.03.004.00 1 11/06/2015	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante i ... a con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2.	SOMMANO m²	45,00	37,39	1'682,55
17 NP EL 002	impianto elettrico zona ingresso - citofono - plafoniere collegamenti - tubi cavi - cablaggi				
	A R I P O R T A R E				19'193,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 NP ED 004 12/06/2015	F.P.O.di armadio per quadri elettrici e canale - riquadro in alluminio per passamalati	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
2 NP ED 003 11/06/2015	rasatura compreso la posa dell'autolivellante	SOMMANO mq	34,22	8,00	273,76
3 06.04.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma esente da alogeni costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandratata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una ba ... eff. d'affrito >0,40 Compreso tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	34,22	54,43	1'862,59
4 03.02.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	SOMMANO mq	15,47	61,88	957,28
5 12.01.007 11/06/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m²	127,34	14,61	1'860,44
6 12.05.FP103 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di fascia battibarella, altezza 200 mm, spessore 25 mm, composta da un profilo continuo in alluminio e un giunto ammortizzante continuo, sui quali si appl ... to al fuoco C1, M1 e B1. Sono compresi i terminali standard di chiusura e gli angoli esterni. Colore a scelta della D.L.	SOMMANO ml	11,00	33,70	370,70
7 12.11.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo acrilovinil ... ento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paraspigolo.	SOMMANO m	15,00	13,66	204,90
8 03.02.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	SOMMANO mq	19,30	61,88	1'194,28
	A R I P O R T A R E				8'223,95




**COMPUTO METRICO
COLLEGAMENTO ORIZZONTALE
LAVORI AGGIUNTIVI**

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO, 19/06/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI							
			unitario	TOTALE						
	RIPORTO			29'241,85						
RIEPILOGO FINALE										
	Importo dei Lavori euro ribasso d'appalto (-22,84%)			29'241,85 -6'678,84						
	TOTALE GENERALE euro			22'563,01						
ASCOLI PICENO, 13/11/2015										
	Il Direttore dei Lavori ing. Raffaele DIGIALLUCA		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">289</td> <td style="text-align: center;">Di Gialluca dott. Raffaele</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INGEGNERE</td> </tr> </table>		ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO		289	Di Gialluca dott. Raffaele	INGEGNERE	
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO										
289	Di Gialluca dott. Raffaele									
INGEGNERE										
	L'impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.									
	Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI		 Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO srl L'AMMINISTRATORE							
										
			A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			10'615,02	
9 12.01.007 11/06/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m ²	200,00	14,61	2'922,00
10 02.04.008 11/06/2015	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cant ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m ²	17,64	22,74	401,13
11 09.03.002 11/06/2015	Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata e con superficie totale della l E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.	SOMMANO m ²	15,84	260,80	4'131,07
12 09.03.008.00 2 11/06/2015	Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.	SOMMANO m ²	15,84	73,12	1'158,22
13 09.03.011 11/06/2015	Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).	SOMMANO m ²	15,84	11,38	180,26
14 07.03.004.00 1 11/06/2015	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante i ... a con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2.	SOMMANO m ²	43,00	37,39	1'682,55
15 NP EL 002 11/06/2015	impianto elettrico zona ingresso - citofono - plafoniere collegamenti - tubi cavi - cablaggi	SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
16 13.24.FP01.0 02 12/11/2015	Fornitura e posa in opera di diffusore elicoidale per mandata e ripresa aria con regolazione manuale dei deflettori, con parte frontale circolare o quadrata, con attacco laterale d ... ro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Diffusore elicoidale. 400x16.	SOMMANO cadauno	5,00	305,32	1'526,60
17 13.24.005.00 2-	Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili tipo con trattamento antibatterici ... era perfettamente funzionante.				
	A RIPIORTARE				25'116,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 NP ED 004 12/06/2015	F.P.O.di armadio per quadri elettrici e canale - riquadro in alluminio per passamalati				
	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	
2 NP ED 003 11/06/2015	rasatura compreso la posa dell'autolivellante				
	SOMMANO mq	72,52	8,00	580,16	
3 06.04.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma esente da alogeni costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una ba ... eff. d'attrito >0,40 Compreso tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	SOMMANO mq	72,52	54,43	3'947,26	
4 03.02.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte				
	SOMMANO mq	15,47	61,88	957,28	
5 12.01.007 11/06/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
	SOMMANO m²	127,34	14,61	1'860,44	
6 12.05.FP103 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di fascia battibattente, altezza 200 mm, spessore 25 mm, composta da un profilo continuo in alluminio e un giunto ammortizzante continuo, sui quali si appl ... to al fuoco C1, M1 e B1. Sono compresi i terminali standard di chiusura e gli angoli esterni. Colore a scelta della D.L.				
	SOMMANO ml	11,00	33,70	370,70	
7 12.11.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo acrilovinil ... ento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paraspigolo.				
	SOMMANO m	15,00	13,66	204,90	
8 03.02.FP03 11/06/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte				
	SOMMANO mq	19,30	61,88	1'194,28	
A RIPORTARE					10'615,02

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI
PICENO

ASCOLI PICENO, 13/11/2015



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 15.03,FP11.a - 001	Fornitura e posa in opera di Telecamera cilindrica IP da esterno antivandalo a Led 1.3 Megapixel Day & Night con rimozione del filtro IR • Standard Onvif Profilo S • sensore Aptina CMOS 1/3" 1280x960 pixel a scansione progressiva • Dual Stream • fino a 30ips ad ogni risoluzione • compressione video H.264 e MJPEG • 0,1 lux F1.2 a colori, 0,05 lux F1.2 in bianco e nero e 0 Lux a led accesi • DNR 3D (riduzione digitale del rumore) • BLC • rapporto S/N >50dB • Slot per Micro SD/SDH card fino a 32GB max • varifocale 2,8~12mm F1.4 • portata led max 30m • porta Ethernet 100 base-T • protocolli supportati ▶ IPv4/IPv6 ▶ http ▶ FTP ▶ DNS ▶ RTSP ▶ RTCP ▶ RTP ▶ TCP ▶ UDP ▶ DHCP ▶ UDP ▶ DDNS ▶ PPPoE ▶ SMTP • protezione con password • Motion Detector • 5 Privacy Zone • uscita video analogica • in/out audio • ingresso di allarme • IP66 • housing in alluminio con supporto a parete/soffitto e passaggio cavi protetto • alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc • consumo max 10W a Led accesi • dimensioni (AxP) 90x248,8mm. sala operatoria n° 1 sala operatoria n° 2 sala operatoria n° 3 sala operatoria n° 4 sala operatoria n° 5					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'300,00	13'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'000,00
	TOTALE euro							13'000,00
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							13'000,00

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO
F.P.O. TELECAMERE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI
PICENO

ASCOLI PICENO, 13/11/2015



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		6'835,57
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'835,57
	TOTALE euro							8'835,57
	<p>ASCOLI PICENO, 13/11/2015</p> <p>Il Direttore dei Lavori ing. Raffaele DIGIALLUCA</p> <p>L'Impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI</p> <p style="text-align: right;">Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO srl L'AMMINISTRATORE</p>							
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 289 Di Gialluca dott. Raffaele INGEGNERE </div>							
	ALBO PRETORIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'093,82
	aereo idraulico.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	112,09	224,18
7 16.02.007.00 6 18/05/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	82,00	328,00
8 03.02.FP03 18/05/2015	Fornitura e posa in opera di cassonetto in cartongesso per rivestimento dei pilastri della struttura portante in acciaio. Il cassonetto sarà costituito da una lastra di cartongesso ... missione di rumori attraverso le strutture dell'edificio e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte					0,00	61,88	0,00
	SOMMANO mq							
9 NP EL 001 19/05/2015	smontaggio di plafoniere, sistemazione linea elettrica, f.p.o. di nuove plafoniere linee elettriche zona filtro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
10 12.01.007 19/05/2015	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. zona filtro zona filtro	4,00 2,00	1,80 4,50			3,500 3,500	25,20 31,50	
	SOMMANO m²					56,70	14,61	828,39
11 12.01.008 19/05/2015	Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo. Vedi voce n° 10 [m² 56.70]					56,70		
	SOMMANO m²					56,70	6,37	361,18
12 NP IA 001 9/05/2015	impianto antincendio così realizzato : smontaggio di infisso per posizionamento di apertura meccanica, motore per apertura serramento, posizionamento di rilevatore di fumo, posizionamento di spia per rilevatore fumo, impianto elettrico per elettromagneti porte e collegamento alla centralina zona filtro					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		6'835,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.03.011 19/05/2015	Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. zona filtro		1,80	4,300		7,74		
	SOMMANO m²					7,74	12,96	100,31
2 NP ED 001 06/10/2014	Fornitura e posa in opera di struttura metallica per posizionamento di porte REI - Profilo montante scatolare 70x40x2 in acciaio nero verniciato con due mani di minio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	161,02	322,04
3 03.02.FP102- a 19/05/2015	Provvista e posa in opera di parete divisoria REI 120 avente indice del potere fonoisolante Rw = 59 dB - con rapporto di prova di riferimento - e costituita da doppia struttura reo ... aracolpi e battibarella, pensili e travi testaletto, quadri elettrici. Spessore totale della parete mm 137,5. REI 120. zona filtro	2,00	1,80		3,500	12,60		
	SOMMANO mq					12,60	50,11	631,39
4 16.02.004.00 9 18/05/2015	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornito e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la finteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150. nuovo filtro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	977,34	1'954,68
5 16.02.007.00 4 18/05/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	271,35	1'085,40
5 16.02.007.00 5 18/05/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta							
	A RIPORTARE							4'093,82

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO

ZONA FILTRO

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO, 13/11/2015

IL TECNICO

ing. Raffaele DIGIALLUCA

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO

289

Di Gialluca dott. Raffaele

INGEGNERE

L'importo totale dei lavori, per i quali la direzione lavori, con il presente verbale, **attesta la regolare esecuzione** e che pertanto si ritengono ammissibili a pagamento da parte dell'Ente appaltante, ammonta a **€ 43 352.47 (euro quarantatremilatrecentocinquantadue/47) IVA compresa.**

Ascoli Piceno, li 13/11/2015

L'impresa
Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Promedia S.r.l.
Ing. Raffaele DI GIALLUCA

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo BIZZARRI




Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'AMMINISTRATORE

ALBO PRETORIO

A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta Territoriale n. 5 - P.O. Ascoli Piceno

Oggetto: **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

Committente: **ASUR REGIONE MARCHE - AREA VASTA N. 5**

Responsabile del Procedimento: **Geom. Remo BIZZARRI**

Impresa appaltatrice: **Costruzioni e Restauri Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU) via dei Gelsi n. 28, P.I. 02220160614**

Contratto: **Rep. n. 7997 del 03/10/2012, Registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 205/10/2012 al n° 2388 serie III**

importo di Contratto: **€ 3.028.610,72 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.1: **€ 3.727.052,39 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.2: **€ 3.912.853,65 oltre IVA**

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ORDINE DI SERVIZIO N° 4/A DEL 20/05/2015

Premesso che:

La ASUR Marche Zona Vasta n. 5 autorizzava l'impresa **Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.** alla fornitura e posa in opera di n° 10 telecamere per le sale operatorie ed ai lavori relativi al completamento della Zona Filtro e del collegamento orizzontale delle vecchie Sale Operatorie, in quanto la stessa ditta risultava esecutrice del **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

1 - Impegno parziale di € 34 358.95 oltre l'IVA per € 3 435.90 per un totale di € 37 794.85 da corrispondere l'impresa **Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.** per i lavori di cui sopra risulta dal seguente prospetto:

Alla data della presente rendicontazione la fornitura, come sopra descritta, è stata effettuata e completata così come da COMPUTO CONSUNTIVO allegato per un importo di **€ 43 352.47 (euro quarantatremilatrecentocinquante/47) IVA compresa**, che di seguito si riassume:

Descrizione forniture e lavorazioni	IMPORTO TOTALE
ZONA FILTRO	8 835,57
TELECAMERE	13 000,00
COLLAGAMENTO ORIZZONTALE	29 241,85
IMPORTO TOTALE LORDO FORNITURA e POSA IN OPERA	51 077,42
ribasso d'appalto 22,84%	11 666,08
IMPORTO TOTALE NETTO FORNITURA e POSA IN OPERA	39 411,34



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_987884	Data richiesta	21/09/2015	Scadenza validità	19/01/2016
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI E RESTAURI MENALE ANTIMO S.R.L.
Codice fiscale	02220160614
Sede legale	VIA DEI GELSI 61030 PS

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
